

Практическая работа №4. Передача между продуктом и техникой: релизы X и X+1

Выполнила: Писарева Юлия Игоревна, М4200с

Цель работы: понять, как взаимодействуют продуктовая и техническая команды при передаче требований и как коммуникации влияют на качество релизов и соблюдение SLA.

Что нужно сделать:

1. Определи две итерации: **релиз X** (разработка текущей версии) и **релиз X+1** (подготовка следующей).
2. Опиши процесс передачи задач от продукта к технике. Укажи, какие данные продукт передаёт, какие SLA закреплены за технической командой.
3. Составь документ **Передача требований и SLA**.
4. Внеси **чёрного лебедя** -неожиданное событие, которое мешает коммуникации, например:
 - внезапное изменение приоритетов от руководства;
 - увольнение или перегрузка ключевого сотрудника;
 - несогласованность между web и mobile-командами;
 - ошибка в постановке задачи, обнаруженная слишком поздно.
5. Опиши, как команда перераспределила ответственность, пересмотрела SLA и восстановила качество взаимодействия.

Что оформить в отчёте:


- Схему взаимодействий между ролями (Product Owner, Team Lead, QA, Support).
- Документ передачи требований и SLA.
- Описание инцидента и корректирующих действий.

Ход работы:

1. Определи две итерации: **релиз X** (разработка текущей версии) и **релиз X+1** (подготовка следующей).

Релиз X	Добавлен push для мобильного клиента	• Продуктовая цель: увеличение вовлеченности пользователей на 25% • Техническая цель: интеграция с Firebase Cloud Messaging, обработка кликов
Релиз X+1	Новый дизайн интерфейса	• Продуктовая цель: улучшение пользовательского опыта, рост NPS до 4.2 • Техническая цель: рефакторинг UI компонентов, адаптивная верстка

2. Опиши процесс передачи задач от продукта к технике. Укажи, какие данные продукт передаёт, какие SLA закреплены за технической командой.

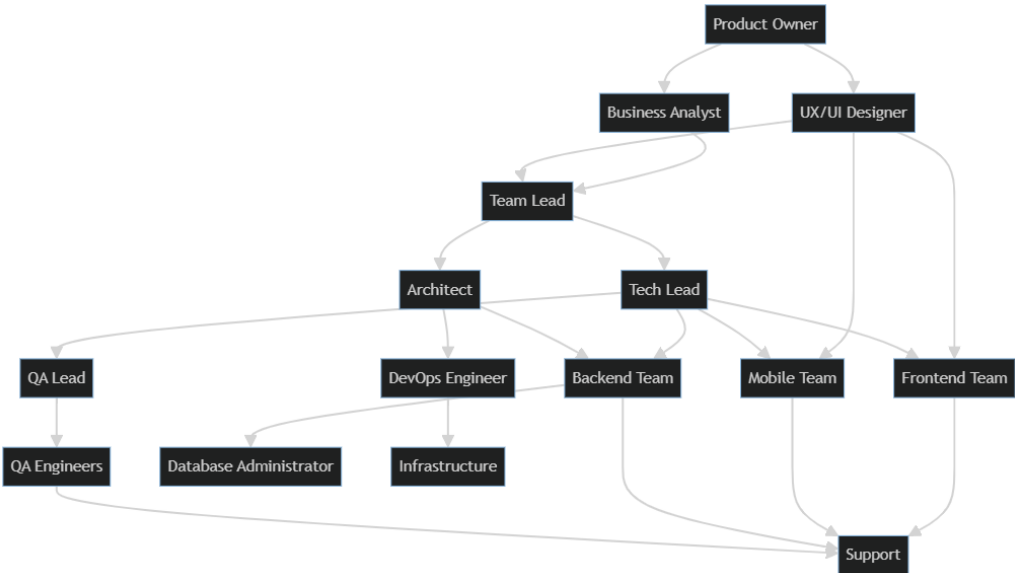

Участники процесса:

Со стороны продукта:

- Product Owner (PO) - главный инициатор
- UX/UI Designer - проектирование пользовательского опыта
- Business Analyst (BA) - детализация требований

Со стороны техники:

- Team Lead - оценка сложности, распределение ресурсов
- Tech Lead - архитектурные решения, технические ограничения
- Разработчики (Frontend, Backend, Mobile) - оценка трудозатрат
- QA Lead - оценка тестовой нагрузки

ИНИЦИАЦИЯ (от продукта к технике)	
Входные данные от продукта: 1. Product Vision Document: - Бизнес-цель релиза - Целевые метрики - Сроки market launch 2. User Stories: - Как пользователь, я хочу [действие], чтобы [ценность] - Критерии приемки - Ограничения и зависимости 3. Дизайн-макеты: - Figma ссылки - Интерактивные прототипы	Как передать: Совещание
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА (от техники к продукту)	
Действия технической команды: 1. Анализ осуществимости: - Соответствие текущей архитектуре - Наличие необходимых компетенций в команде - Совместимость с существующим кодом 2. Декомпозиция и оценка: - Разбивка на технические задачи - Оценка в задача/часах - Выявление рисков и зависимостей 3. Архитектурные предложения: - Альтернативные реализации - Технический долг	Как передать: Заключение: - общая стоимость - рекомендации по архитектуре - риски - зависимости (возможно внешние)
СОВМЕСТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (продукт и техника)	
Воркшоп: Обсуждение вопросов: - Приоритизация фич внутри релиза - Что можно упростить для ускорения - MVP или полная реализация - План постепенного rollout	На выходе: Документ с четкими приоритетами

SLA, которые закреплены за технической командой:

Скорость ответа	Качество оценки	Коммуникация	Качество передачи
• <u>Время на ответ на запрос оценки</u>: не более 2 рабочих дней • <u>Время на ответ на уточняющие вопросы</u>: не более 3 рабочих часов • <u>Время на проверку фиксированной документации</u>: не более 1 рабочего дня	• <u>Точность оценки времени мелких задач</u>: не более 1/5 от затраченного времени • <u>Точность оценки времени средних задач</u>: не более 1/3 от затраченного времени • <u>Точность оценки времени крупных задач</u>: не более 1/2 от затраченного времени	• <u>Дейлики</u>: 10:00-10:15 • <u>Еженедельный созвон</u>: пн 11:00 • <u>Общее уведомление о проблемах</u>: если проблема не решена за 1 рабочий день • <u>Доступность разработчика</u>: ответ в течение 3 часов	• <u>API документация</u>: не более чем через 24 часа после мерджа • <u>Инструкция по развертыванию</u>: совместно с изменениями • <u>Тест-кейсы с описанием</u>: покрывают все критерии приема

3. Составь документ **Передача требований и SLA**.

См Приложение 1

4. Внеси **чёрного лебедя** - неожиданное событие, которое мешает коммуникации: **внезапное изменение приоритетов от руководства – за 7 дней до релиза 3**.

5. Опиши, как команда перераспределила ответственность, пересмотрела SLA и восстановила качество взаимодействия.

Узнали об инциденте: за 7 дней до планируемого Релиза 3, за 30–60 минут до конца рабочего дня.

Сообщение от руководства:

«Инициатор: Генеральный директор.

Требование: добавить интеграцию с мессенджером МАКС.

Обоснование: исследование показало, что 80% пользователей используют этот мессенджер.

Сроки: совместно с релизом 3.

Приоритет: срочно, максимальный.»

Было	Новый план
Готовность Релиза 3: 82% Успеваем в плановую дату релиза: да	Остановить работу по задачам с меньшим приоритетом. Перенаправить силы на интеграцию с МАКС. Пересмотр сроков релиза.

Первые последствия: так как Product Owner не был готов к такому, то и все задачи, которые были поставлены ранее, становятся не актуальными. Появляется из-за этого паника в команде. Разработчики получают новые инструкции, которые не совпадают с запланированными. Руководство (Генеральный директор) хочет одного, Продуктовая команда, хочет продвижения продукта, и сохранения сроков,

Техническая команда хочет, чтобы их планы не менялись, они уже всё распланировали. Случается демотивация – команда видит, что их планы легко ломаются.

Из-за такого могут возникнуть нарушения в SLA: так как у всех происходит перепланировка задач, то и ответы на вопросы будут увеличены (паника + другие планы), возможно дейлики будут временно отменены, но может быть поставлена большая встреча, где будет решено как быть дальше, какие задачи будут ставиться, и чтобы успокоить команду.

Анализ проблемы:

Команды (тех + продукт) не были готовы к такой новости, поэтому не было определено ролей, ответственных за такое, нет четких зон ответственности, нет процедуры изменения приоритетов, чтобы перераспределить задачи.

Новые задачи пришли в момент непланирования, а уже на этапе завершения задач.

Не было запланировано время для решения такого вида инцидента, нужно уложиться в очень короткие сроки, переносить релиз пока что считается невозможным.

Действия (немедленные, сразу после получения сообщения):

Product Owner:

- Созвал экстренное совещание с техлидом и тимлидом
- Составил список вопросов к руководству
- Заблокировал дальнейшие изменения до прояснения

Team Lead:

- Приостановил код-ревью и мерж PR
- Собрал текущий статус по всем задачам
- Оценил риски срыва сроков

Tech Lead:

- Быстрая оценка сложности интеграции
- Анализ влияния на текущую архитектуру
- Подготовка альтернативных решений

Дальнейшие действия:

После получения любой новой информации по вопросу от руководства – собирать созвон с Product Owner, Team Lead, Tech Lead. Построить дашборд, доступный всем участникам для просмотра, чтобы не было непоняток внутри команды. Обновлять информацию для всей команды (каждые ~4 часа).

Получается у нас образовалась команда (Product Owner, Team Lead, Tech Lead), которая активно участвует в корректировке плана релиза 3. Контакт с руководством

поддерживает Product Owner. Каждый день, в конце рабочего дня (18:00 МСК) собрание, на котором сообщается текущее положение по задачам.

По процессам было решено: собрать сначала MVP для интеграции, для этого направить ресурсы разработчиков и тестировщика. Поставили сроки релиза (предложили подвинуть).

Долгосрочные решения:

После такого инцидента команда решила внести изменения в SLA: создан буфер времени (чтобы была возможность переносить релиз), введен процесс (и описан) как действовать в подобных ситуациях. Так же был добавлен запрет на общение с руководством всех кроме Product Owner. Во избежание неожиданных сообщений Product Owner должен раз в неделю созваниваться с руководством для согласования требований и показа результатов.

Раздел в SLA:

Управление изменениями:

Экстренное изменение (не более 1 в спринт):

1. Поступление запроса
2. Сбор команды (Product Owner, Team Lead, Tech Lead) + по возможности руководство *[не более чем через 4 часа после получения запроса]*
3. Нахождение решения
4. Передача решения всей команде
5. Оценка нового плана *[не более 2 часов]*

Правила коммуникации:

- Все запросы проходят по изменениям проходят через Product Owner
- Прозрачная документация для всех изменений приоритетов

Приложение 1

ДОКУМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ТРЕБОВАНИЙ И SLA

1. Контекст передачи

1.1. Участники передачи

Роль	Ответственный	Контакты
Product Owner	Иванова А.С.	a.ivanova@company.ru
Team Lead	Петров В.И.	v.petrov@company.ru
Tech Lead	Сидоров Д.К.	d.sidorov@company.ru
QA Lead	Козлова М.П.	m.kozlova@company.ru

1.2. Связанные релизы

Исходный релиз: Релиз 2 «Добавлен push для мобильного клиента»

Целевой релиз: Релиз 3 «Новый дизайн интерфейса»

2. Результаты предыдущего релиза

2.1. Достигнутые показатели Релиза 2

Метрики качества:

- аптайм: 98.8% (план: 99.5%)
- количество багов: 4 (план: ≤ 2)
- время отклика API: 280 мс (план: ≤ 300 мс)

2.2. Извлеченные уроки

Успешно завершенные задачи:

- Успешная интеграция с Firebase Cloud Messaging
- Стабильная доставка уведомлений на 95% устройств
- Налажена система А/В тестирования пушей

Задачи, завершенные с ошибкой:

- «Ошибка SDK push-уведомлений»
- Расхождение в метриках между iOS/Android
- Недостаточное тестирование на разных устройствах

2.3. Накопленный технический долг

Технический долг:

- Рефакторинг обработки ошибок SDK
- Унификация метрик для iOS/Android
- Оптимизация потребления батареи

3. Требования для релиза 3

3.1. Бизнес-требования

Бизнес цели:

- основная:
 - Увеличение удержания пользователей на 20%
- дополнительные:
 - Улучшение NPS с 3.8 до 4.2
 - Увеличение времени в приложении на 2 минуты
 - Снижение оттока на 15%

Целевые метрики:

- DAU (Daily Active Users): +25%
- Session Duration: ≥ 5.5 минут
- Conversion Rate: +12%

3.2. Функциональные требования

Основные функции:

6. Обновленный UI/UX дизайн
 - Полностью переработанная навигация
 - Новая система цветов и типографики
 - Адаптивный дизайн для планшетов
7. Улучшенная пользовательская лента
 - Интеллектуальная сортировка контента
 - Плавные анимации переходов
 - Персонализированные рекомендации
8. Обновленный профиль пользователя
 - Расширенные настройки приватности
 - Визуализация статистики активности
 - Система достижений и бейджей

3.3. Нефункциональные требования

Производительность	Безопасность	Совместимость
• Время загрузки экрана: ≤ 1.5 секунд • Частота кадров: ≥ 60 fps • Потребление памяти: ≤ 150 МБ	• Защита данных: соответствие GDPR • Аутентификация: OAuth 2.0 + 2FA • шифрование: TLS 1.3+	• ios: 14.0+ • android: 8.0+ • Веб-браузеры: Chrome 80+, Safari 13+, Firefox 75+

4. Service Level Agreement (SLA)

4.1. SLA качества продукта

Качество продукта:

- аптайм: $\geq 99.5\%$
- время отклика api: ≤ 300 мс
- количество критических багов: ≤ 2

4.2. SLA процессов разработки

Процессы разработки:

- оценка задач: ≤ 2 рабочих дня
- code review: ≤ 1 рабочего дня
- покрытие тестами: $\geq 80\%$
- успешные сборки ci/cd: $\geq 95\%$
- время развертывания: ≤ 30 минут

4.3. SLA коммуникации

Взаимодействие:

- ответ на вопросы: ≤ 3 рабочих часа
- дейлики: 10:00-10:15
- еженедельные созвоны: понедельник 11:00
- демо релиза: за 2 дня до продакшена
- эскалация проблем: ≤ 1 рабочего дня

5. Критерии приемки

5.1. Функциональная приемка

- ☐ Все пользовательские сценарии работают корректно
- ☐ Дизайн соответствует макетам в Figma ($\pm 2px$)
- ☐ Адаптивность проверена на 3+ разрешениях
- ☐ Навигация интуитивна и последовательна

5.2. Техническая приемка

- ☐ Unit-тесты покрывают $\geq 80\%$ кода
- ☐ Integration-тесты проходят на 100%
- ☐ Performance-тесты укладываются в лимиты
- ☐ Security audit не выявил критических уязвимостей

5.3. Бизнес-приемка

- ☐ A/B тесты показывают улучшение метрик
- ☐ User acceptance testing пройден успешно
- ☐ Документация для пользователей готова
- ☐ Маркетинговые материалы подготовлены

6. Риски митигации

6.1. Идентифицированные риски

Риски:

- Конфликт дизайнера и фронтендера
- Недооценка сложности анимаций
- Расхождение дизайна между платформами
- Падение производительности

6.2. План митигации

Меры предотвращения

- Регулярные дизайн-ревью - 2 раза в неделю
- Раннее прототипирование сложных анимаций
- Кроссплатформенные код-ревью между iOS/Android
- Performance benchmarking на каждом этапе

7. План роллаута

7.1. Этапы внедрения

Этапы:

Этап 1: "Внутреннее тестирование (5% команды) - 2 дня"

Этап 2: "Бета-тестирование (10% пользователей) - 3 дня"

Этап 3: "Постепенный rollout (25% → 50% → 100%) - 4 дня"

Этап 4: "Полное внедрение - 1 день"

7.2. Откатная стратегия

Условия для отката:

- Критический баг, влияющий на >15% пользователей
- Падение основных метрик на >20%
- Падение производительности на >25%

Процедура отката:

1. Автоматическое переключение на предыдущую версию
2. Уведомление всех заинтересованных сторон
3. Анализ причин и планирование исправлений

8. Подписи и согласование

8.1. Подписавшие стороны

Product Owner: _____ / Иванова А.С. Дата: _____

Team Lead: _____ / Петров В.И. Дата: _____

Tech Lead: _____ / Сидоров Д.К. Дата: _____

QA Lead: _____ / Козлова М.П. Дата: _____

8.2. Статус документа

Статус: "СОГЛАСОВАН"

Версия: 1.0.1

Последнее обновление: 25.11.2025

Следующий review: 22.04.2026

